

# Projet :Système de gestion de réservation d'hôtel

| <u>Membre</u>     |   | <u>Rôle Scrum</u> |
|-------------------|---|-------------------|
| Yousra Errami     | : | Scrum Master      |
| Oumaima Elmansoum | : | Product Owner     |
| Marwa Haidarah    | : | Développeuse      |
| Aya Qotbi         | : | Développeuse      |

## Justification des rôles

Oumaima Elmansoum est **Product Owner** car elle possède de bonnes compétences pour comprendre les besoins des utilisateurs et gérer le Product Backlog afin de définir les priorités du projet. Yousra Errami est **Scrum Master** car elle est disponible pour organiser le travail de l'équipe, animer les réunions Scrum et aider à résoudre les blocages.

## **Objectif du projet:**

Le projet consiste à créer une application web pour gérer les réservations d'un hôtel. Elle permettra aux clients de réserver des chambres et des activités en ligne, tout en facilitant le travail du personnel administratif. L'objectif est d'améliorer l'organisation, de réduire les erreurs et d'offrir une expérience utilisateur simple et efficace.

## **Rappel du livrable 2**

- Durée totale du projet : environ 8 semaines
- Nombre de sprints prévus : 4 sprints
- Durée d'un sprint : 2 semaines
- Vitesse initiale estimée : environ 12 Story Points par sprint

# Product Backlog initial

| ID    | User Story                                                                                | Critères d'acceptation                                                      | Story Points | Priorité (MoSCoW) | Sprint cible |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| US-01 | En tant que utilisateur, je veux créer un compte afin de réserver des services            | Email unique ;Champs obligatoires validés;<br>Confirmation inscription      | 5            | Must              | Sprint 1     |
| US-02 | En tant que client, je veux réserver une chambre afin de séjourner à l'hôtel              | Sélection date valide; Chambre disponible;Confirmation affichée             | 8            | Must              | Sprint 2     |
| US-03 | En tant que client, je veux consulter mes réservations afin de suivre mes séjours         | Liste affichée; Informations correctes; Accès rapide                        | 3            | Must              | Sprint 2     |
| US-04 | En tant que client, je veux annuler une réservation afin de libérer une chambre           | Bouton annuler visible; Mise à jour immédiate ; Message de confirmation     | 5            | Should            | Sprint 3     |
| US-05 | En tant que client, je veux modifier une réservation afin de changer mes dates ou chambre | Modification possible; Vérification disponibilité ; Mise à jour enregistrée | 8            | Should            | Sprint 3     |

|       |                                                                                                   |                                                                                |   |        |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|
| US-06 | En tant que client, je veux réserver une activité afin de profiter des services de l'hôtel        | Liste activités affichée; Créneau disponible; Confirmation ajout               | 5 | Should | Sprint 3 |
| US-07 | En tant que réceptionniste, je veux gérer les réservations afin de organiser les clients          | Accès aux réservations; Modification possible; Suppression possible            | 8 | Must   | Sprint 2 |
| US-08 | En tant que administrateur, je veux gérer les utilisateurs afin de contrôler les accès            | Ajouter utilisateur; Supprimer utilisateur; Modifier rôle                      | 5 | Could  | Sprint 4 |
| US-9  | En tant que manager, je veux consulter les statistiques afin de analyser les performances         | Nombre de réservations affiché; Taux d'annulation visible; Interface claire    | 8 | Could  | Sprint 4 |
| US-10 | En tant que utilisateur, je veux recevoir des notifications afin de être informé des réservations | Email envoyé; Confirmation reçue                                               | 3 | Could  | Sprint 4 |
| US-11 | En tant que système, je veux vérifier la disponibilité des chambres afin d'éviter les conflits    | Pas de double réservation; Vérification en temps réel; Message si indisponible | 8 | Must   | Sprint 2 |

# Planification des Sprints

## Vue d'ensemble des releases et sprints

| Sprint   | Période               | Sprint Goal                                                                      | US incluses                | Total pts |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Sprint 1 | Sem. 1 – Sem. 2       | Mettre en place la création de compte des utilisateurs                           | US-01                      | 5         |
| Sprint 2 | Sem. 3 – Sem. 4       | Implémenter la réservation et la consultation des réservations                   | US-02, US-03, US-07, US-11 | 27        |
| Sprint 3 | Semaine 5 – Semaine 6 | Ajouter la modification et l’annulation des réservations ainsi que les activités | US-04, US-05, US-06        | 18        |
| Sprint 4 | Semaine 7 – Semaine 8 | Implémenter les fonctionnalités avancées et l’administration                     | US-08, US-09, US-10        | 16        |

## Sprint Backlog détaillé du Sprint 1

| US    | Sous-tâche                                        | Responsable | Estimation (h) | Statut  |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| US-01 | Définir les exigences de l'inscription            | Oumaima     | 2 h            | À faire |
| US-01 | Organiser le sprint et suivre les tâches          | Yousra      | 2 h            | À faire |
| US-01 | Créer le formulaire d'inscription (Frontend)      | Marwa       | 4 h            | À faire |
| US-01 | Valider les champs du formulaire                  | Aya         | 3 h            | À faire |
| US-01 | Enregistrer l'utilisateur dans la base de données | Aya         | 4 h            | À faire |
| US-01 | Afficher le message de confirmation               | Marwa       | 2 h            | À faire |

## Sprint Backlog détaillé du Sprint 2

| US    | Sous-tâche                                          | Responsable | Estimation (h) | Statut  |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| US-02 | Définir les critères fonctionnels de la réservation | Oumaima     | 2 h            | À faire |
| US-02 | Suivre l'avancement et résoudre les blocages        | Yousra      | 2 h            | À faire |
| US-02 | Créer le formulaire de réservation                  | Marwa       | 4 h            | À faire |
| US-02 | Enregistrer la réservation dans la base de données  | Aya         | 5 h            | À faire |
| US-03 | Afficher la liste des réservations du client        | Marwa       | 4 h            | À faire |
| US-07 | Interface de gestion des réservations               | Marwa       | 5 h            | À faire |
| US-11 | Vérifier la disponibilité des chambres              | Aya         | 5 h            | À faire |

**N.B:** La vélocité est estimée à 6 à 8 points par développeur. Avec deux développeuses, la capacité de l'équipe est de 12 à 16 points par sprint.

# Simulation des cérémonies Scrum

## Sprint Planning

☐ **Participants et durée**

Product Owner (Oumaima)

Scrum Master (Yousra)

Équipe de développement (Marwa + Aya)

Durée : 2 heures

☐ **User Stories sélectionnées(issues du backlog)**

| ID    | User Story              | Priorité | Story Points |
|-------|-------------------------|----------|--------------|
| US-01 | Inscription utilisateur | Must     | 5            |
| US-03 | Consulter réservations  | Must     | 3            |



## Justification du choix :

Ces User Stories ont été choisies car elles sont prioritaires (Must), peu complexes et permettent de mettre en place les bases du système tout en respectant la vélocité de l'équipe.

### ☐ **Sprint Goal**

\_Permettre aux utilisateurs de créer un compte, se connecter et consulter leurs réservations.

### ☐ **Risques / blocages**

Mauvaise structure base de données

Gestion des sessions utilisateur

Retard technique (API non prête)

## Exemple de Daily Scrum

| Membre                | Qu'ai-je fait hier ?      | Que vais-je faire aujourd'hui ?  | Ai-je des blocages ?           |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Oumaima (PO)          | Clarification des besoins | Vérification des fonctionnalités | Non                            |
| Yousra (Scrum Master) | Organisation du sprint    | Suivi de l'équipe                | Non                            |
| Marwa (Développeuse)  | Développement inscription | Tests du formulaire              | Non                            |
| Aya (Développeuse)    | Début API inscription     | Finaliser API                    | Oui (problème base de données) |

## Sprint Review

### ☐ **Fonctionnalités démontrées et livrées selon la DoD**

US-01 : Inscription utilisateur (terminée et conforme à la DoD)

US-03 : Consultation des réservations (partiellement réalisée)

### ☐ **Fonctionnalités non terminées et raisons**

Fonctionnalités non terminées et raisons

☐ **Retours du Product Owner ou du client ctif**

Inscription validée et interface claire.

Améliorer les messages d’erreur et la gestion des réservations.

☐ **Vélocité**

Prévu : 8 SP

Réalisé : 5 SP

**Sprint Rétrospective**

|                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>-Mettre en place plus de tests dès le début du développement</li><li>-Planifier des mini réunions techniques en cas de problème</li></ul> |
| <b>Stop</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>-Attendre la fin du sprint pour détecter les erreurs techniques</li><li>-Travailler de manière isolée sans coordination</li></ul>         |
| <b>Continue</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>-Organiser des Daily Scrum réguliers</li><li>-Travailler avec une répartition claire des tâches</li></ul>                                 |

# Définition of Ready et Définition of Done

- Définition of Ready (DoR)


| # | Critère de la Definition of Ready                                              | Dimension             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | La User Story est rédigée au format « En tant que..., je veux..., afin de... » | Compréhension         |
| 2 | Les critères d'acceptation sont définis et testables                           | Qualité fonctionnelle |
| 3 | La User Story apporte une valeur au client                                     | Valeur                |
| 4 | La User Story est estimée (story points définis)                               | Estimation            |
| 5 | La User Story est suffisamment petite pour être réalisée dans un Sprint        | Taille                |
| 6 | La User Story est validée par toute l'équipe                                   | Alignement            |

- **Définition of Done (DoD)**

| # | Critère de la Definition of Done                                  | Dimension       |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Le code est revu par au moins un autre développeur (peer re-view) | Qualité de code |
| 2 | Les tests unitaires associés passent à 100 %                      | Tests           |
| 3 | La fonctionnalité est déployée sur l'environnement de recette     | Déploiement     |
| 4 | Le code fonctionne sans erreurs majeures                          | Qualité de code |
| 5 | La fonctionnalité est testée et validée.                          | Tests           |
| 6 | La documentation est mise à jour si nécessaire                    | Documentation   |

# Suivi et indicateurs

## ❖ Burndown Chart idéal du Sprint 1

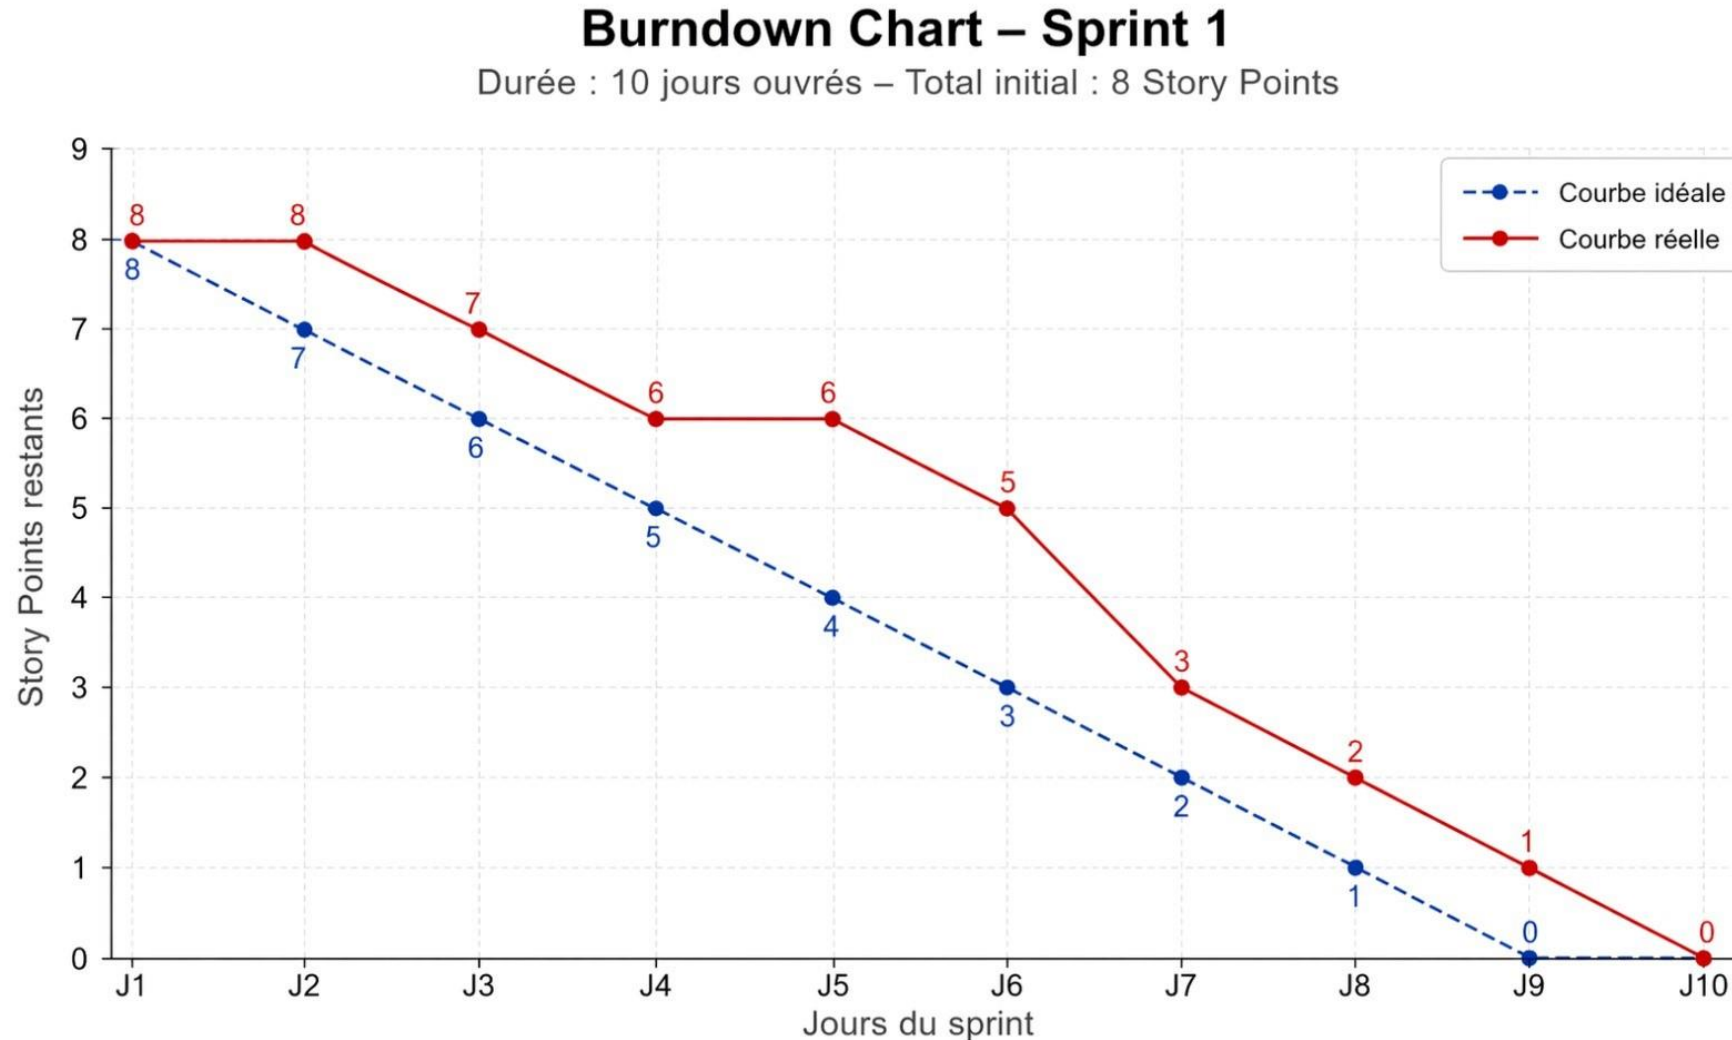

## ❖ Analyse des risques liés à Scrum

| # | Risque identifié                                                                         | Mesure de mitigation                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mauvaise estimation des User Stories (surestimation ou sous-estimation des Story Points) | Utiliser le Planning Poker et ajuster les estimations après chaque sprint (amélioration continue) |
| 2 | Dépendance technique (ex : problème base de données qui bloque plusieurs tâches)         | Identifier les dépendances dès la planification et traiter en priorité les tâches critiques       |
